

Name: Schneider Vorname: Manuel

Ausbildungsjahr: 2

lfd. Blatt-Nummer 48 Woche vom 06.07.2015 bis 10.07.2015

ausgeführte Arbeiten, Berufsschulunterricht, betriebliche u. überbetr. Unterweisungen usw.	Einzel-Std.	Gesamt-Std.
MONTAG		
Kundendienst:		
Außenzapfstelle montiert und mit W/CU-Rohr angeschlossen		
		8
DIENSTAG		
Berufsschule:		
Wassertechnik: Bauteile des Trinkwasserhauseanschlusses		
Wirtschafts- und Sozialkunde: Berufliche Handlungs-Kompetenz als Ausbildungsqualifikation		8
MITTWOCH		
Kundendienst:		
- Niederdruckspeicher und Armatur erneuert	3	
- Wasserfilter und Rückflussverhinderer gewartet	3	
- Verstopfung an Urinal beseitigt	2	
		8
DONNERSTAG		
Baumstelle:		
- Waschbecken und Toiletten abgeladen und in die Wohneinheiten verteilt		
		8
FREITAG		
Kundendienst:		
- Trinkwasser MAG ausgetauscht	3	
- Bulli gewaschen und aufgeräumt	3	
		6
SAMSTAG		
Wochenstunden		38

Bemerkungen:


15.07.15 / [Signature]
 ausbildender Meister
 Datum

Schneider
 10.07.2015
 Auszubildender
 Datum


15.07.15 / [Signature]
 Berufsschule
 Datum

Muffenverbindung an einem WLCU-Rohr herstellen


- ① Den Mantel an den Rohrenden mit einem geeignetem Abmantelwerkzeug ca. 8 cm einschlitzen. Dabei das Rohr nicht beschädigen.

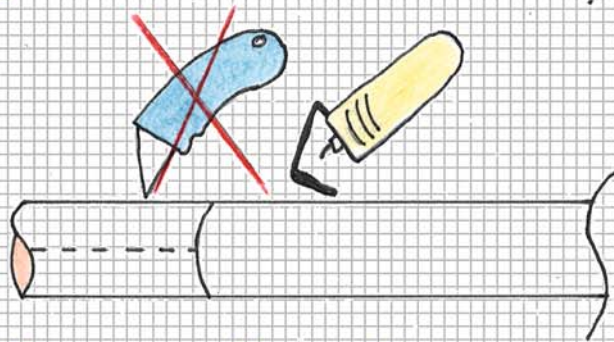

- ② Mantel zurückschlagen und Rohrenden zusammenlöten



- ③ Nach dem abkühlen, den Mantel wieder um das Rohr legen.



- ④ Den Mantel mit geeignetem Klebeband wieder verschließen

